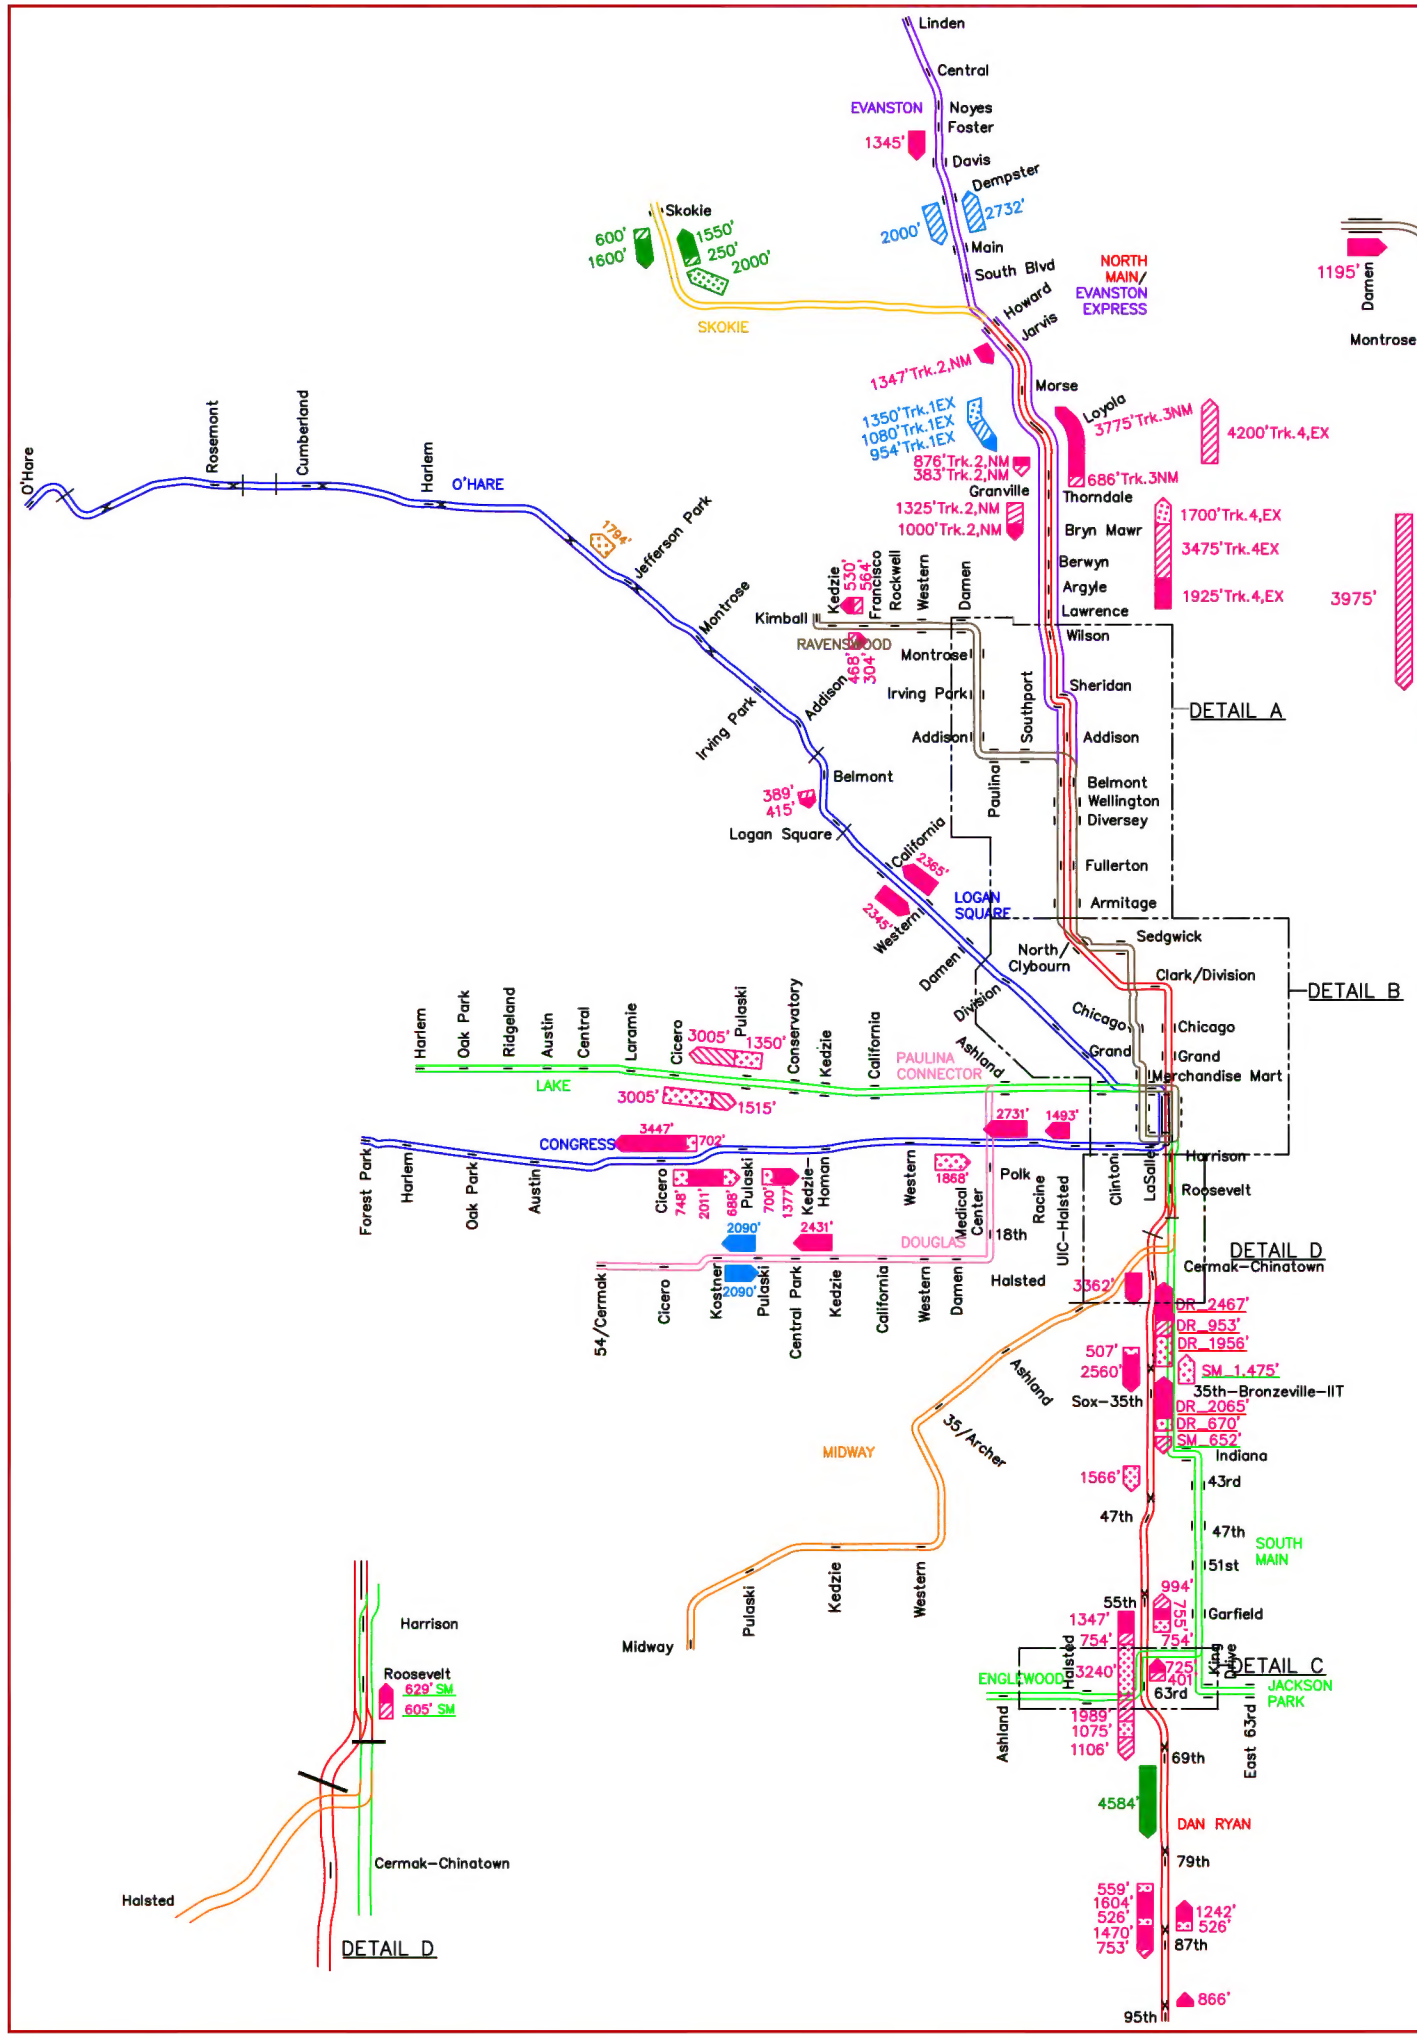

SLOW ZONE BY AREA				
Track (CTA)	15 mph	64,069	119,430	
	25 mph	30,404		
	35 mph	24,957		
Structure (CTA)	15 mph	5,134	12,296	
	25 mph	5,812		
	35 mph	1,350		
Signal (CTA)	15 mph	0	1,794	
	25 mph	0		
	35 mph	1,794		
Power (CTA)	15 mph	0	0	
	25 mph	0		
	35 mph	0		
Construction (CTA/Contractor)	15 mph	9,484	12,334	
	25 mph	850		
	35 mph	2,000		

TOTAL SLOW ZONE TRACK									
Rail Line	15 mph	25 mph	35 mph	Total Slow Zone	Linear Trk.–Ft.	% Slow	Movement Removed	Movement Added	Total SZ	% Slow
Congress	11,059	0	4,706	15,765	94,010	16.8	768	4,224	23,073	7.9
O'Hare/Logan Square	5,125	389	1,794	7,308	152,956	4.8	0	0		
Dearborn Subway	0	0	0	0	45,818	0	0	0		
North Main Line	6,998	2,394	0	9,392	78,966	11.9	0	0	54,519	23.5
State Subway	2,814	937	0	3,751	51,328	7.3	1,701	0		
Dan Ryan	23,047	6,950	11,379	41,376	101,332	40.8	5,732	3,126		
Skokie	3,150	850	2,000	6,000	52,146	11.5	0	0	6,000	11.5
Evanston	1,345	4,732	0	6,077	40,714	14.9	0	0	20,761	20.4
Evanston Express	2,879	8,755	3,050	14,684	60,970	24.1	0	0		
Loop	0	0	0	0	21,470	0	0	0	0	0
Ravenswood/Ravenswood–Loop	15,030	5,007	0	20,037	98,364	20.4	0	1,400	20,037	20.4
Midway/Grand Junction	0	0	0	0	99,224	0	0	0	0	0
Lake	0	4,520	4,355	8,875	93,114	9.5	1,490	1,490	14,853	7.2
South Loop/South Main Line	629	1,257	1,475	3,361	68,906	4.9	0	652		
Englewood	0	1,275	1,342	2,617	31,916	8.2	0	0		
Jackson Park	0	0	0	0	12,162	0	0	0		
Douglas/Paulina Connector	6,611	0	0	6,611	77,710	8.5	0	0	6,611	8.5
TOTALS	78,687	37,066	30,101	145,854	1,181,106	12.3	9,691	10,892		

NOT TO SCALE
GRAPHICAL REPRESENTATION

DATE	DESCRIPTION	
		IN CHARGE C.B.
		APPROVED BY B.M.jr
		CHECKED BY B.M.jr
		UPDATED BY D.E.
16 MAY 06	ORIGINAL	ORIGINATED BY J.J.H.
		Prepared by: Track Maintenance

CTA RAIL CUSTOMER IMPACT MAP

August 10, 2011
